Rif.Prot.n° : **037/21 – 1635**

OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI S.p.A.
Via Chiese n. 72
20126 - MILANO
Tel : 02 8180951
e-mail: omega.direzione.axima@engie.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Rilasciata al committente dall'impresa installatrice

(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto **GIUSEPPE BISIGNANO** Legale Rappresentante dell'Impresa **OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI S.p.A.** operante nel settore **IMPIANTISTICO** con sede in via **CHIESE** n. **72,** comune di **MILANO,** tel. **028180951,** partita IVA **00888690153.**

■ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di **MILANO n. 00888690153 - REA 209677**

☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di…n…

esecutrice dell'impianto: **Reti esterne raccolta acque**

inteso come:

■ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1) .....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

Commissionato da: **DATA 4 ITALY S.r.l.** installato nei locali siti nel comune di **Settimo Milanese (MI)** in **Via Reiss Romoli angolo via Monzoro, Edificio DC06**, di proprietà di **DATA 4 ITALY S.r.l.** in edificio adibito ad uso:

■ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da **P.I.T. Paolo Micheletti, Albo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Provincia Milano e Lodi, Numero di iscrizione all'albo 3606**
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego **UNI10339, UNI12237, EN/UNI/CE**;
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI S.p.A.
Via Chiese n. 72
20126 - MILANO
Tel : 02 8180951
e-mail: omega.direzione.axima@engie.com

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4): **vedi manuale operativo Vol. 1÷4 e allegati;**
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5): **vedi manuale operativo Vol. 1÷4 e allegati;**
- schema di impianto realizzato (6): **dis. n° C_00_00_SC_00_01**
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8)

.....
.....
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data: **14/06/2021**

Il responsabile tecnico

OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI S.p.A.
Il Direttore Tecnico

.....

(timbro e firma)

Il delegato del dichiarante

OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI S.p.A.
Il Vice Presidente

.....

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI S.p.A.
Via Chiese n. 72
20126 - MILANO
Tel : 02 8180951
e-mail: omega.direzione.axima@engie.com

Legenda:

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.
4) Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
   Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
   Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
6) Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera).
   Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
9) Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all’art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.

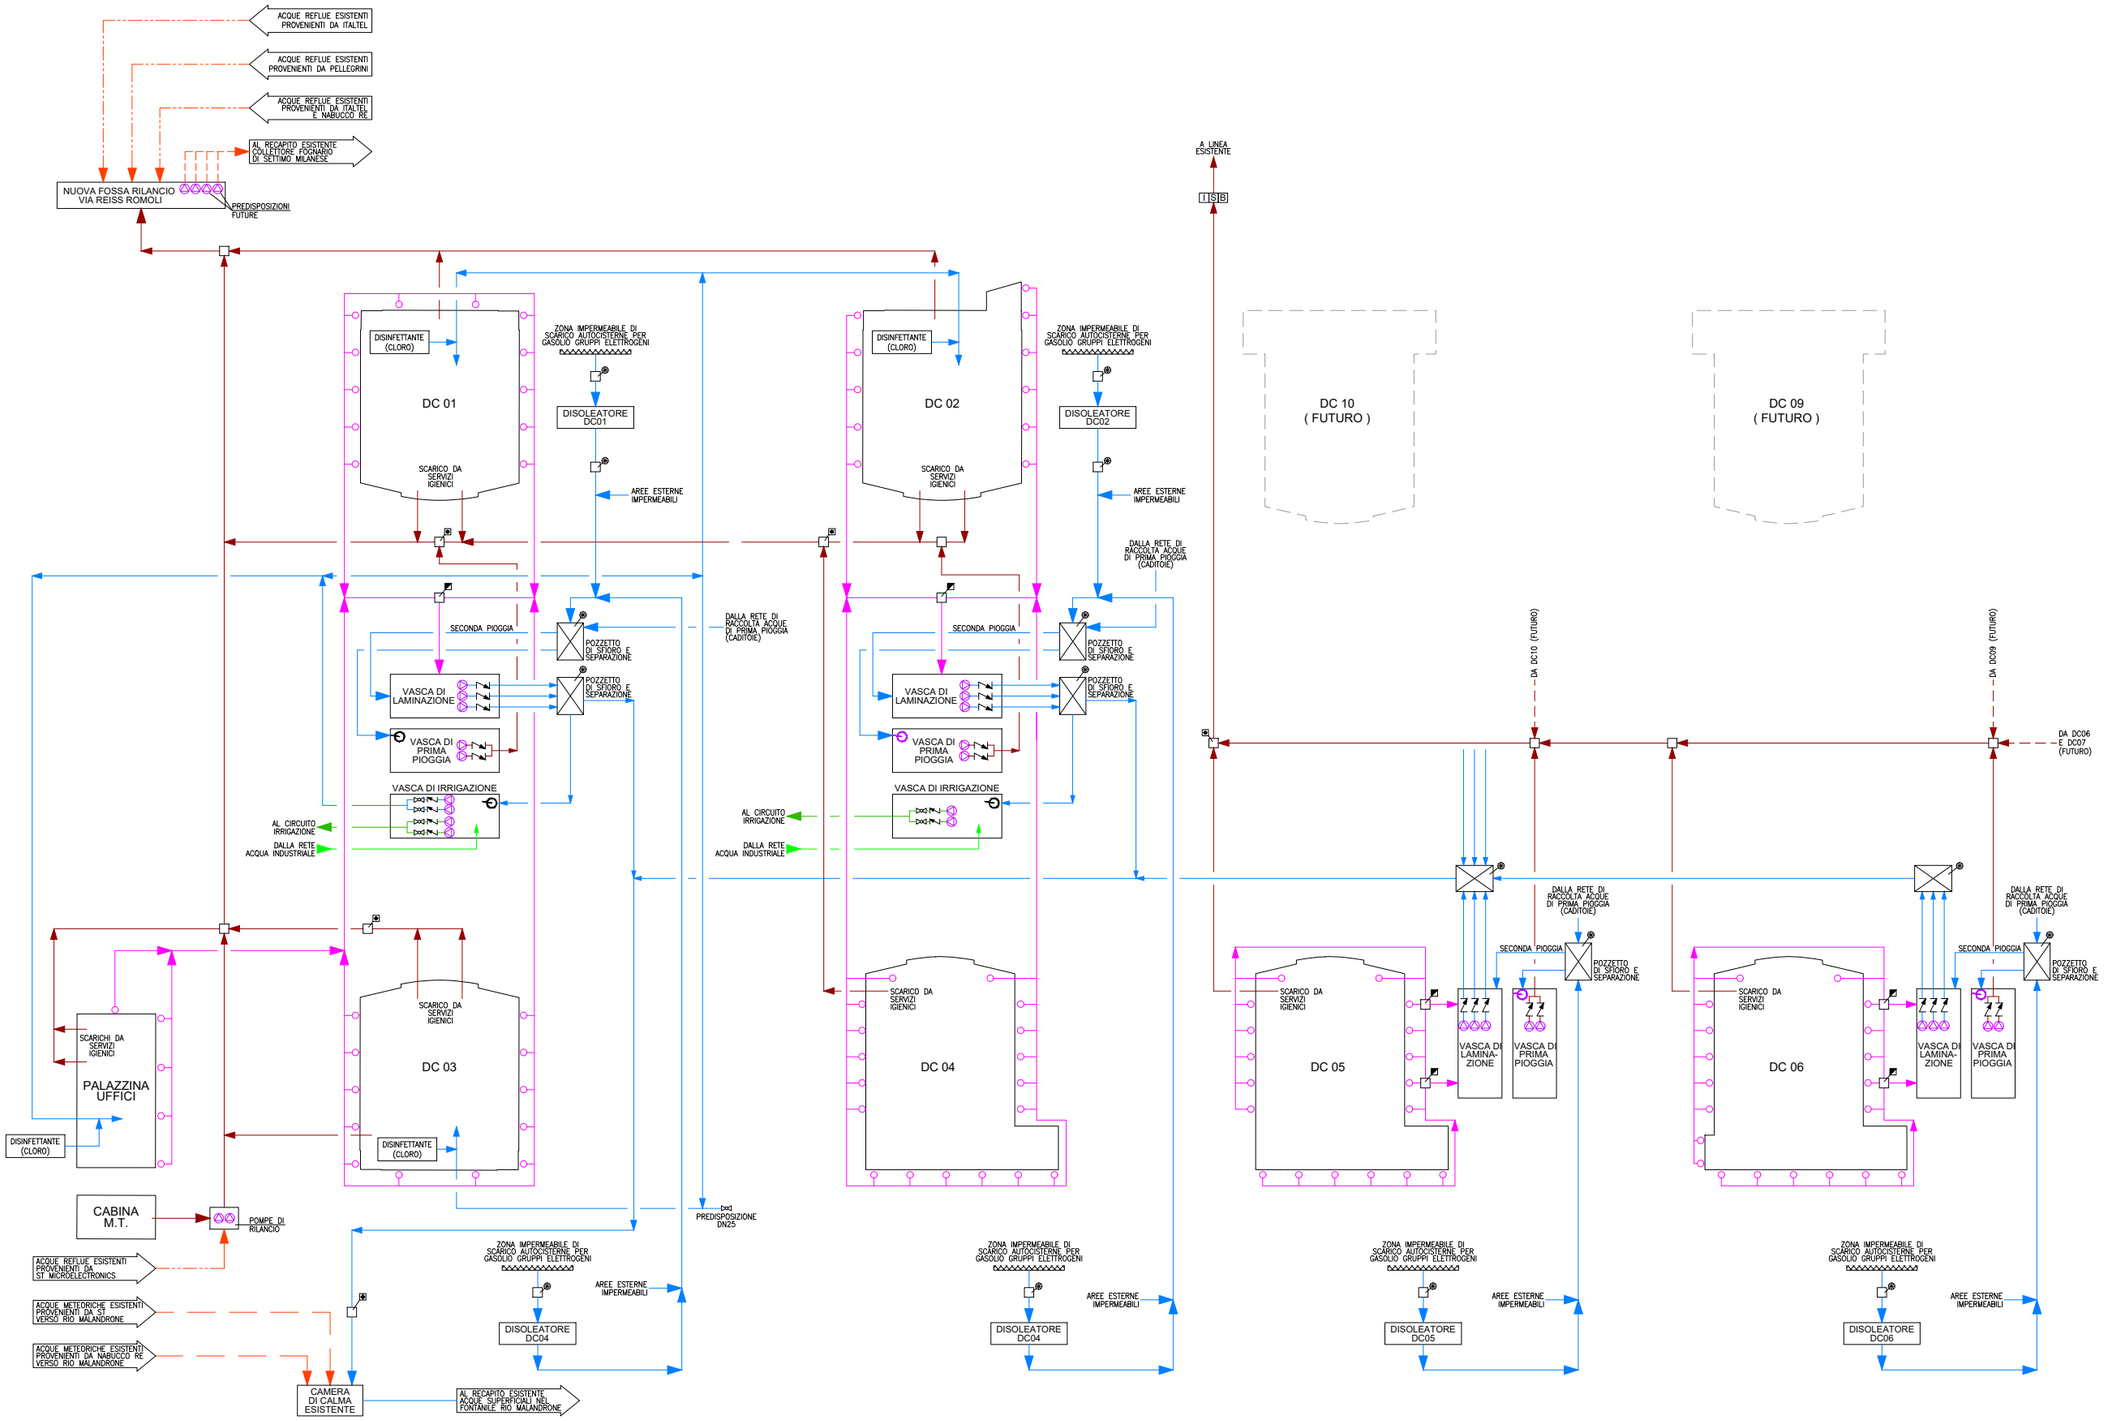
ACQUE REFLUE ESISTENTI PROVENIENTI DA ITALTEL
ACQUE REFLUE ESISTENTI PROVENIENTI DA PELLEGRINI
ACQUE REFLUE ESISTENTI PROVENIENTI DA ITALTEL E NABUCCO RE
AL RECAPITO ESISTENTE COLLETTORE FOGNARIO DI SETTIMO MILANESE
NUOVA FOSSA RILANCIO VIA REISS ROMOLI
PREDISPOSIZIONI FUTURE
A LINEA ESISTENTE
I S B
DC 01
DC 02
DC 03
DC 04
DC 05
DC 06
DC 10 (FUTURO)
DC 09 (FUTURO)
DISINFETTANTE (CLORO)
ZONA IMPERMEABILE DI SCARICO AUTOCISTERNE PER GASOLIO GRUPPI ELETTROGENI
DISOLEATORE DC01
DISOLEATORE DC02
DISOLEATORE DC04
DISOLEATORE DC05
DISOLEATORE DC06
SCARICO DA SERVIZI IGIENICI
AREE ESTERNE IMPERMEABILI
DALLA RETE DI RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (CADITOIE)
SECONDA PIOGGIA
POZZETTO DI SFIORO E SEPARAZIONE
VASCA DI LAMINAZIONE
VASCA DI PRIMA PIOGGIA
VASCA DI LAMINA-ZIONE
VASCA DI IRRIGAZIONE
AL CIRCUITO IRRIGAZIONE
DALLA RETE ACQUA INDUSTRIALE
PALAZZINA UFFICI
SCARICHI DA SERVIZI IGIENICI
CABINA M.T.
POMPE DI RILANCIO
ACQUE REFLUE ESISTENTI PROVENIENTI DA ST MICROELECTRONICS
ACQUE METEORICHE ESISTENTI PROVENIENTI DA ST VERSO RIO MALANDRONE
ACQUE METEORICHE ESISTENTI PROVENIENTI DA NABUCCO RE VERSO RIO MALANDRONE
CAMERA DI CALMA ESISTENTE
AL RECAPITO ESISTENTE ACQUE SUPERFICIALI NEL FONTANILE RIO MALANDRONE
DN25 PREDISPOSIZIONE
DA DC10 (FUTURO)
DA DC09 (FUTURO)
DA DC06 E DC07 (FUTURO)

LEGENDA

	PUNTO PRELIEVO CAMPIONI ACQUE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI
	PUNTO PRELIEVO CAMPIONI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAI PIAZZALI
	PUNTO PRELIEVO CAMPIONI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE
	PUNTO PRELIEVO CAMPIONI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA PROVENIENTI DAI PIAZZALI E DALLA COPERTURA VERSO FONTANILE RIO MALANDRONE
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
	VALVOLA A SFERA
	VALVOLA DI RITEGNO
	VALVOLA DI LIMITAZIONE DEL CARICO CON CHIUSURA A GALLEGGIANTE
	TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE METORICHE PROVENIENTI DAI PIAZZALI IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE INTERRATE
	TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA COPERTURA IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE INTERRATE
	TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)
	TUBAZIONI ACQUE METEORICHE IN USCITA DALLE VASCHE DI LAMINAZIONE VERSO IL RECAPITO ESISTENTE NEL FONTANILE RIO MALANDRONE IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE INTERRATE
	TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE METEORICHE ESISTENTI
	TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE REFLUE ESISTENTI
	TUBAZIONI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE IN PRESSIONE ESISTENTI
VASCA DI LAMINAZIONE	VASCA DI LAMINAZIONE IN ELEMENTI PREFABBRICATI EQUIPAGGIATA CON N°3 ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER INVIO ACQUA LAMINATA A PORTATA CONTROLLATA AL PUNTO DI RECAPITO ESISTENTE ACQUE SUPERFICIALI NEL FONTANILE RIO MALANDRONE
VASCA DI PRIMA PIOGGIA	VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN ELEMENTI PREFABBRICATI EQUIPAGGIATA CON N°2 ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER INVIO ACQUA A PORTATA CONTROLLATA AL RECAPITO FOGNARIO ESISTENTE
DISOLEATORE	DISOLEATORE STATICO LAMELLARE PREFABBRICATO

NOTE

1 – PER IL VOLUME DELLE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA E DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE RELATIVE AL PROGETTO DC05, VEDERE STUDIO DI INVARIANZA IDRAULICA DI M6 ENGINEERING srl, DOCUMENTO n° K225–RT_0 REVISIONE 0 DEL GIUGNO 2019

Per. Ind. MICHELETTI PAOLO n° 3606 Termotecnica
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI MILANO e LODI

progetto n.
13 03 - DATA 4 ITALY - CORNAREDO/SETTIMO M.SE

supervisore delegato del committente (maitre d'ouvre):
GIS.IMO S.r.l.
centro direzionale quattrotorri
06132 PERUGIA
tel.: +39 075 517 29 83 fax: +39 075 518 12 88

assistente del committente (A.M.O.):
GARRETTI ASSOCIATI S.r.l.
via Trieste, 9 - 20146 MILANO
tel.: +39 02 430 6931 fax: +39 02 480 170 51
www.garrettiassociati.it

progetto architettonico:
GARRETTI ASSOCIATI S.r.l.
via Trieste, 9 - 20146 MILANO
tel.: +39 02 430 6931 fax: +39 02 480 170 51
www.garrettiassociati.it

opere edili e prefabbricati:
GENERALE PREFABBRICATI S.p.a.
centro direzionale quattrotorri
06132 PERUGIA
tel.: +39 075 517 29 83 fax: +39 075 518 12 88
www.generaleprefabbricatispa.com

impianti meccanici:
OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI S.p.a.
Via Chiese, 72 - 20126 - MILANO
tel.: +39 02 8180951
e-mail: omega.direzione.axima@engie.com

impianti elettrici/dati:
ENGIE CONTRACTING ITALIA S.r.l.
via G. Ribotta 31
00144 Roma

SCHNEIDER ELECTRIC S.p.A.
Via Circonvallazione Est, 1 - 24040 STEZZANO (BG)
tel.: +39 0354151111 fax: +39 0354153200
www.schneider-electric.com

ENERIA
Rue de Longpont - BP 10202 - 91311 MONTLHERY Cedex - FRANCE
tel.: +33 (0) 169802100 fax: +33 (0) 169802150
www.eneria.fr

progettazione antincendio:
STUDIO TECNICO ZACCARELLI S.r.l.
via Ludovico il Moro, 17 - 20143 MILANO
tel.: +39 02 891 200 81 fax: +39 02 813 962 8
www.studiozaccarelli.it

supervisione:
ITALSOCOTEC S.p.a.
Via Pontaccio,12/A- 20121 Milano
tel.: +39 02 89051500 fax +39 02 89051501
italsocotec@italsocotec.it

prima emissione
28 febbraio 2014

disegnato da
AB

AGGIORNAMENTI

cod	data	descrizione
F	04.03.2019	COME COSTRUITO EDIFICIO DC04
G	14.06.2019	REVISIONE GENERALE PER AGGIUNTA EDIFICIO DC05
H	29.11.2019	AGGIORNAMENTO DOPO MODIFICA VASCHE DC05
I	12.03.2021	AGGIUNTO EDIFICIO DC06

descrizione:
DATA 4 ITALY
SCHEMA DI FLUSSO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI, ACQUE METEORICHE E ZONE DI SCARICO GASOLIO PER GRUPPI ELETTROGENI

elaborato a cura di:
OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI Italia - BU Industria
Via Chiese, 72 - 20126 MILANO
tel.: +39 02 8180951
e-mail: omega.direzione.axima@engie.com

proprietà
DATA 4 ITALY S.R.L.
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 MILANO

progetto
DATA CENTER CAMPUS
PROGETTO ESECUTIVO

EXTERNAL WORKS

scala:
/ A0

tavola n.
C 00 00 SC 00 01

RETI ESTERNE
